

搬入車両実績表 (8/1~8/14)

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

材料	1 木		2 金		3 土		4 日		5 月		6 火		7 水		8 木		9 金		10 土		11 日		12 月		13 火		14 水	
	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数												
伸縮管			大型車	1							大型車	1																
排煙処理塔									大型車	1																		
固化剤ホッパ											大型車	1																
ダクト類			大型車	1										大型車	1													


搬入状況

搬入時



工事エリア

赤矢印：搬入経路

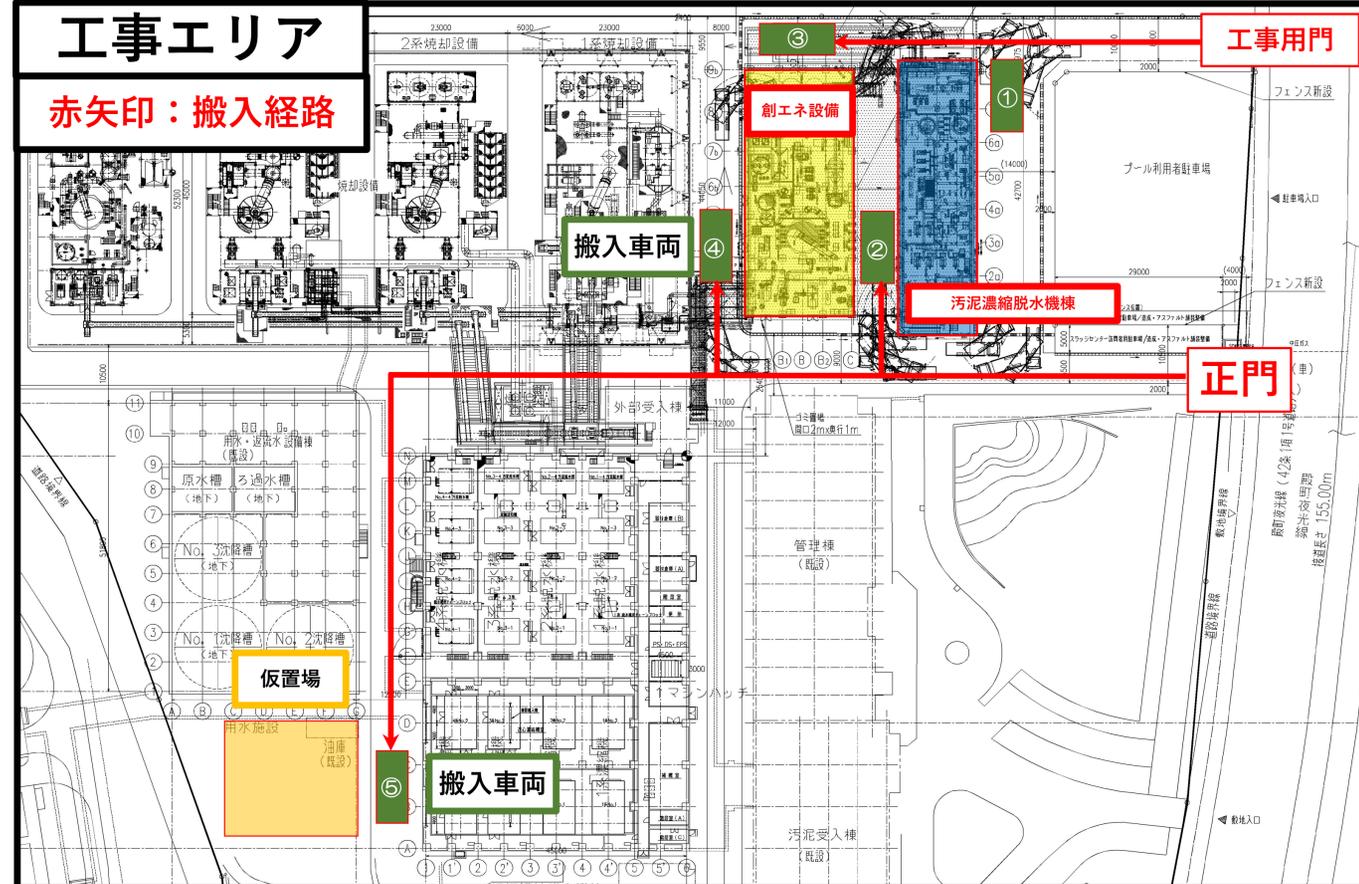

搬入車両実績表 (8/15~8/28)

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

材料	15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		
	木		金		土		日		月		火		水		木		金		土		日		月		火		水		
	車両情報	台数																											
蒸気ボイラ					大型車	1																							
No.1灰ホッパ											大型車	1																	
苛性ソーダタンク																							大型車	1					
脱酸剤貯留槽																							大型車	1					
清缶剤貯留槽																							大型車	1					
															大型車	1													


搬入状況

搬入時



工事エリア

赤矢印：搬入経路

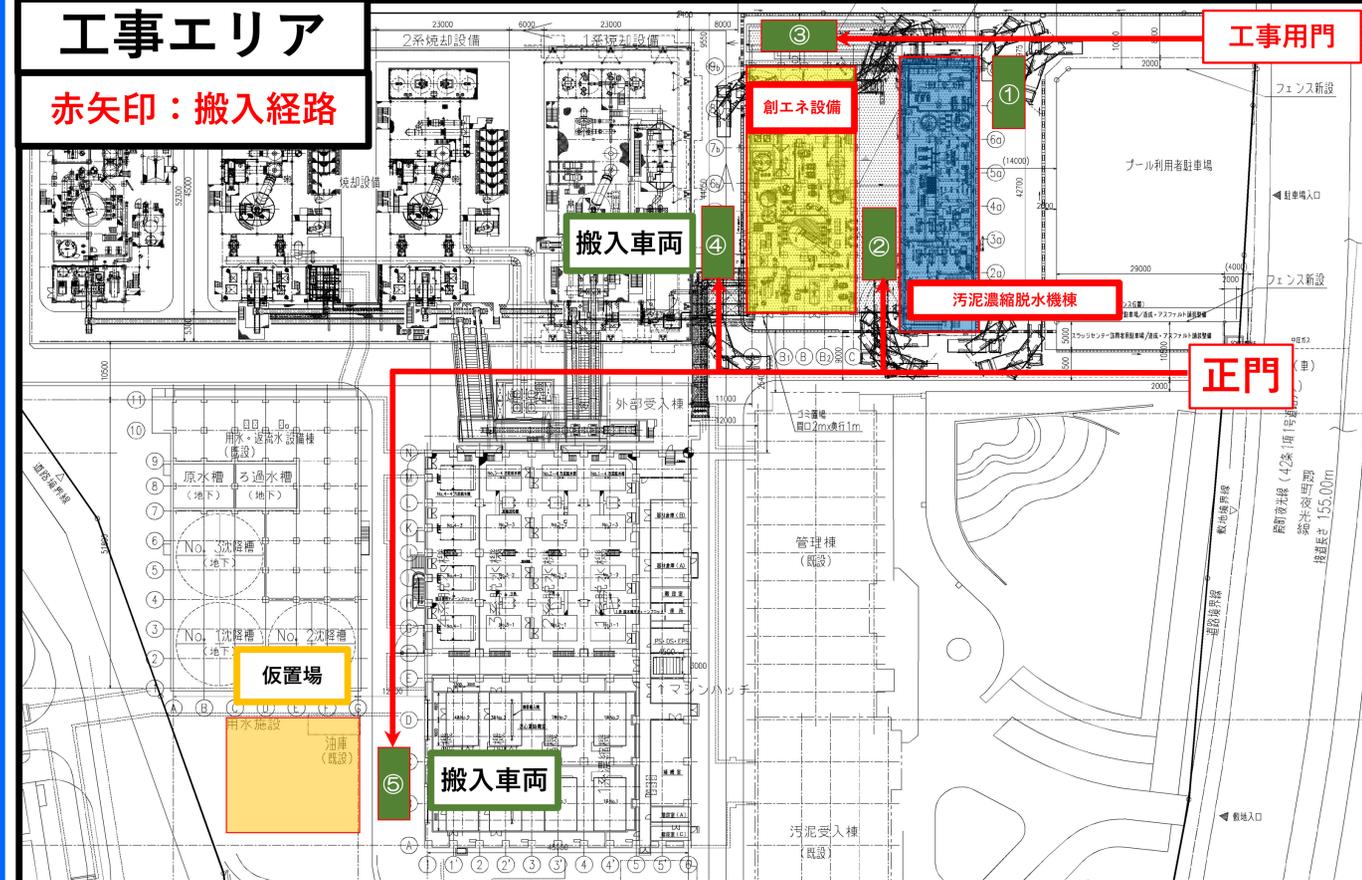



搬入車両予定表 (9/1~9/14)

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

日付 材料	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	日		月		火		水		木		金		土		日		月		火		水		木		金		土	
	車両情報	台数																										
蒸気サイレンサ													大型車	1														
鉄骨																							大型車	3	大型車	3		

搬入状況

搬入時

工事エリア

赤矢印：搬入経路

